

Customer Portal — Garden Rooms & Poolhouses

Supplementary specification for garden rooms, poolhouses and canopies — built on the approved base design of the outdoor-kitchen portal.

VERSION

1.0 · 17 August 2026

CLIENT

Tim & Bram · info@vanuitambacht.nl

BASE

Customer Portal Brief — Outdoor Kitchens v1.1

ATTACHMENT

klantportaal-buitenverblijf-mockup.html

HOW TO READ THIS BRIEF — AND A LANGUAGE NOTE

The outdoor-kitchen portal is the base; this brief only describes what is different or additional for garden-room projects. Everything not mentioned here works exactly as in the base brief: magic-link access after approval, read-only choices, the proposal-approval flow, components, copy, notifications, mobile requirements and acceptance criteria. As in the base brief: **all customer-facing copy is Dutch**; English in [brackets] is a gloss for the developer only and never ships.

1 What is different for garden rooms

ASPECT	OUTDOOR KITCHEN (BASE)	GARDEN ROOM / POOLHOUSE
Order value	€ 3,000 – € 6,000	€ 25,000 – € 60,000
Instalments	50% approval / 50% delivery	40% approval / 40% start of build / 20% handover
Production	workshop, then delivered	built on site by the craftsman
Scheduling	one delivery day (day + slot)	week-based schedule: preparation / materials / build week, each with a week number
Schedule status	on schedule / fixed / delayed	additional: provisional / definitive — definitive after the site survey
Extra phase	—	Site survey (“schouw”) — proposal-approval flow
Imagery	1 render + diagram	render-driven: main render, multiple views, detail renders, version history
Extra documents	—	permit check, preparation guide, neighbour letter, render package
Extra aftercare	—	seasonal maintenance calendar + 3-month check
Provisional sums	rare	quote line with  marker; “definitive after the survey”

PHASE MODEL (CUSTOMER VIEW, DUTCH)

Akkoord & ontwerp → Schouw →
Voorbereiding → Materialen → De bouw →
Oplevering → Nazorg
[Approved & design → Site survey → Preparation →
Materials → The build → Handover → Aftercare]

NAVIGATION (RENAMED ITEMS, DUTCH)

Ontwerp & renders (was: Ontwerp & opties) ·
Planning & bouw (was: Planning & levering) ·
Foto's & updates (was: Foto's uit de werkplaats).
All other items identical to the base.

2 New and changed screen elements

2.1 Render viewer (screen Ontwerp & renders)

- **Main render**, large ($\pm 16:7$), with version badge and date.
- **View thumbnails** (2–6: front, side, interior, from the garden, ...): click swaps the main render; swipe on mobile.
- **Day/evening toggle** — only shown when an evening render has been uploaded.
- **Detail renders** (row of 3): wood type, roof, floor — each with 1–2 plain-language lines.
- **Layout diagram** (existing `LayoutDiagram` component), segment widths proportional to real dimensions.
- **Version history** (`RenderVersionList`): per version a thumbnail, date and a mandatory “**what changed**” line (entered at upload, preferably including the customer's reason). Older versions dimmed but viewable. View-only; remarks go through messages — **no approval button** (same rule as the working drawing).
- **Conditional**: the viewer only renders when renders have been uploaded; otherwise stat tiles + choices with the line “De renders van jouw ontwerp volgen hier.” [Your design renders will appear here.]

Data source: uploads of type *render* per project: version number, view label, day/evening flag, change line.
Dashboard → portal.

2.2 Week-based schedule (screen Planning & bouw)

- **Week bar** (`WeekBar`): one row of week blocks from now until handover, coloured per phase (done / now / preparation / materials / build) + legend. Mobile: 5 blocks per row.
- **Phase cards** (`WeekCard`): large week number + date range + status + what it means for the customer (“your garden stays usable”, “ $\pm 15 \text{ m}^2$ of storage space needed”).
- **Provisional/definitive** (`ProvDefBadge`): dashed orange “○ Voorlopig — definitief na de schouw” vs. green “✓ Definitief”. **Rule: the badge appears everywhere a week is mentioned** — never present a provisional week as fact.
- **Survey proposal**: identical proposal flow as the delivery day in the base (“Akkoord — plan de schouw in” / “Andere dag aanvragen”). After the survey Tim or Bram sets the schedule to definitive → notification “Jouw planning staat vast” + .ics invitations per phase.
- **Preparation checklist** (tickable, visible to Tim & Bram): access $\geq 1.20 \text{ m}$ · site clear ($\pm 15 \text{ m}^2$) · power point $\leq 25 \text{ m}$ · parking · neighbours informed.
- **Neighbour letter**: downloadable PDF with the build dates auto-filled (same PDF pipeline as the quote).
- **Delay**: same announcement rule as the base; the week bar shifts automatically.

Data source: planning module per project (phase, week numbers, date range, provisional/definitive). Survey approval and checklist ticks: portal → dashboard.

2.3 Foto's & updates

- One chronological stream, grouped per week, with two card types: photo cards (as in the base) and **personal update cards** (`TeamUpdateCard`): T&B avatar, "Update van Tim/Bram", date, 2–3 sentences in WhatsApp tone.
- Updates are posted by Tim & Bram, also on behalf of the build team — the craftsman gets **no** direct channel to the customer.
- Target rhythm during the build week: 1 update per build day; the dashboard reminds them with a task.

2.4 Payments: three instalments (40/40/20)

- Three `PaymentTerm` cards. Copy: "bij start bouw — factuur volgt aan het begin van de bouwweek" [at start of build — invoice follows at the start of the build week] and "bij oplevering — pas als alles staat en jij tevreden bent" [at handover — only once everything is up and you are happy].
- **Coupling**: the 3rd instalment only becomes payable after the handover confirmation in the portal (handover confirmed → send 20% invoice).
- Provisional-sum quote lines carry * + footnote "definitief na de schouw".

2.5 Handover & aftercare: extras

- **Seasonal maintenance calendar** (4 cards: spring / summer / autumn / winter) + opt-in "stuur mij per seizoen een onderhoudsherinnering" (scheduled notification).
- **3-month check**: fixed aftercare moment 3 months after handover. Shown in the portal as a planned step ("Gepland · januari 2027"); automatically a dashboard task. Executed by phone/WhatsApp; the craftsman visits if anything needs fixing.
- Handover checklist adapted to construction: built according to drawing/render · roof and drainage checked · sliding door, electrics and lighting work · garden left tidy.

3 Additional components and copy

COMPONENT	USE	VARIANTS
RenderViewer	main render + view thumbnails + day/evening	only render when uploads exist
RenderVersionList	version history with change line	current · older (dimmed)
WeekBar	week blocks now → handover	done · now · preparation · materials · build
WeekCard	phase card with week number	done · now · planned (provisional/definitive)
ProvDefBadge	provisional vs. definitive	○ provisional (dashed) · ✓ definitive (green)
TeamUpdateCard	personal update in the photo stream	with/without photo
SeasonCard	maintenance calendar	4 seasons

Additional status labels (Dutch, literal): “○ Voorlopig — definitief na de schouw” · “✓ Definitief” · “Wacht op nieuw voorstel” (survey) · “Gepland · {month}” (3-month check)

Additional buttons: “Akkoord — plan de schouw in” · “Alle renders en aanzichten” · “Burenbrief downloaden (pdf)” · “Leuk, houd me eraan”

System messages (Dutch, literal):

- Schedule definitive: “Jouw planning staat vast: voorbereiding in week 39, materialen in week 40, de bouw in week 41 en 42.”
- New render: “Er staat een nieuwe render voor je klaar — versie 2, met de schuifpui op de zuidzijde.”
- Provisional sum: “* Stelpost: dit bedrag is een zorgvuldige inschatting; het definitieve bedrag wordt bij de schouw bevestigd.”

4 Additional data coupling


CUSTOMER PORTAL	SOURCE IN THE DASHBOARD	DIRECTION
Renders (versions, views, day/evening)	Uploads of type <i>render</i> + metadata + change line	dashboard → portal
Week schedule + provisional/definitive	Planning module → phases with week numbers and status	dashboard → portal
Survey proposal / approval / other-day request	planning module + task	both directions
Preparation checklist	ticks as log lines on the project	portal → dashboard
Neighbour-letter PDF	generated from project data (build dates)	dashboard → portal
Team updates	update posts per project (posted by T&B)	dashboard → portal
Handover confirmation → 3rd-instalment invoice	handover confirmed ⇒ bookkeeping creates the 20% invoice	portal → dashboard
3-month check & seasonal reminders	scheduled tasks/notifications by date	dashboard → portal

5 Additional acceptance criteria

- 1. A week with status *provisional* is never shown without the provisional badge; after the survey the whole schedule switches to *definitive* in one action and the customer receives one notification + .ics invitations.
- 2. The render viewer only shows uploaded views; the day/evening toggle only appears when an evening render exists; a new render version produces a “Nieuw” badge + notification containing the change line.
- 3. Render versions remain viewable indefinitely; the change line is mandatory at upload (validated in the dashboard).
- 4. The neighbour-letter PDF contains the current build dates and is regenerated when the schedule changes.
- 5. The 3rd-instalment invoice (20%) can only be created after the handover confirmation has been given in the portal.
- 6. The 3-month check and seasonal reminders are scheduled automatically at handover (check: +3 months; reminders at the chosen seasons).
- 7. Provisional-sum lines always show the * with footnote; after the survey the definitive amount becomes visible with a log line in the quote's version history.

Annex — Visual design (screenshots from the approved mock-up)

The screens below come 1-to-1 from the attached interactive mock-up. The mock-up leads for colours, typography, spacing and components; this brief leads for behaviour. All render and photo areas are placeholders — replace them with real renders when available. All UI copy is Dutch by design.

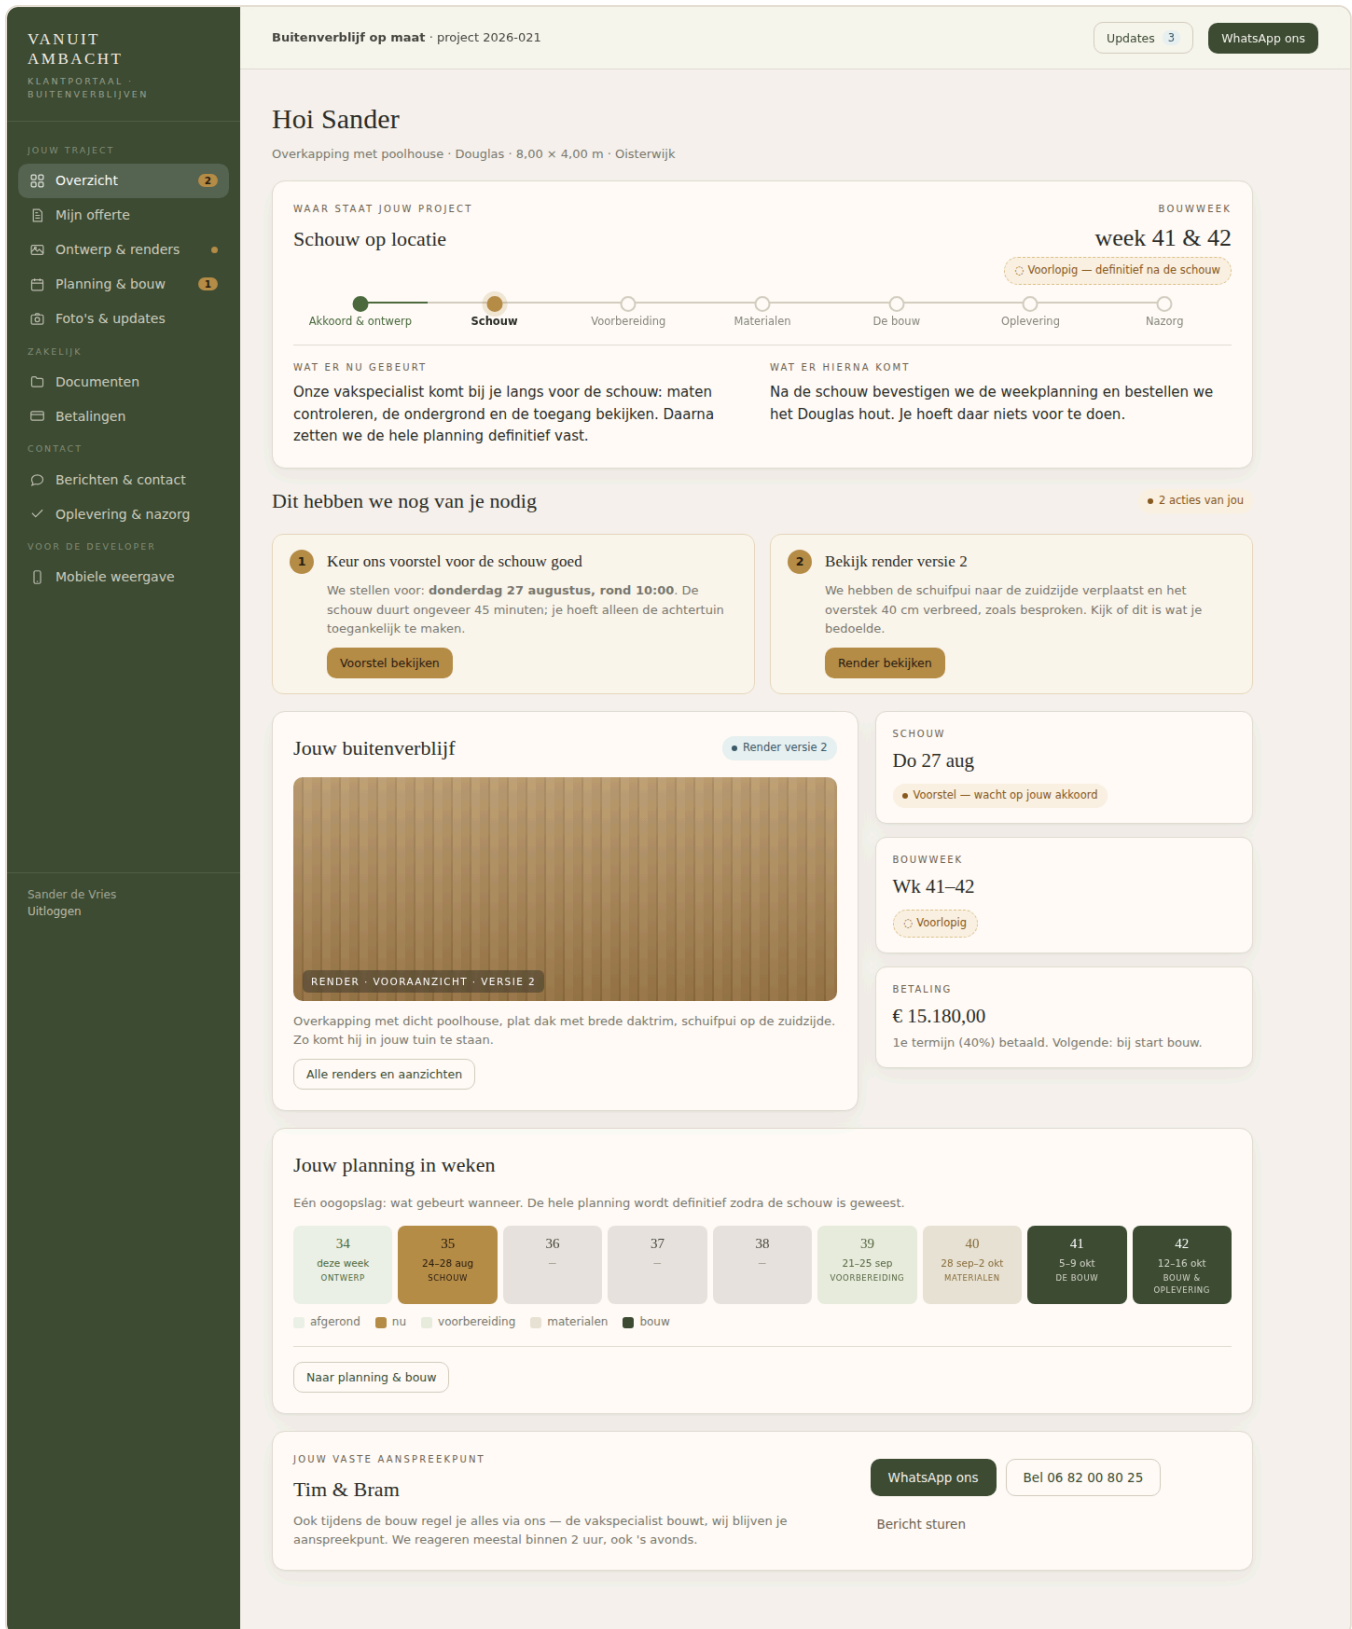

Screen 1 — Overview: main render, week bar with provisional status, survey and render actions.

VANUIT
AMBACHT

KLANTPORTAAL ·
BUITENVERBLIJVEN

JOUW TRAJECT

Overzicht

Mijn offerte

Ontwerp & renders

Planning & bouw

Foto's & updates

ZAKELIJK

Documenten

Betalingen

CONTACT

Berichten & contact

Oplevering & nazorg

VOOR DE DEVELOPER

Mobiele weergave

Sander de Vries

Uitloggen

Buitenverblijf op maat · project 2026-021

Updates 3WhatsApp ons

Mijn offerte

Dit is wat we hebben afgesproken. Alles nog eens rustig nalezen? De pdf staat ook bij je documenten.

OF-2026418

Akkoord gegeven

Overkapping met poolhouse · Douglas · 8,00 × 4,00 m

Opgemaakt op 1 augustus 2026 voor Sander de Vries, Oisterwijk

3 augustus 2026 om 19:32
door Sander de Vries

WAT JE KRIJGT

Buitenverblijf Douglas · 8,00 × 4,00 m

€ 36.500,00

Overkapping met dicht poolhouse (3,00 m), plat dak met EPDM en aluminium daktrim, schuifpui zuidzijde, fundering op betonpoeren.

Elektrapakket

€ 1.450,00

Vier spots in het overkapte deel, dubbel stopcontact en schakelaar in het poolhouse.*

Transport & montage Oisterwijk

Inbegrepen

Aanvoer materialen, bouw en oplevering door onze vakspecialist.

* Stelpost: dit bedrag is een zorgvuldige inschatting; het definitieve bedrag hangt af van de situatie ter plekke en wordt bij de schouw bevestigd.

INBEGREPEN BIJ JOUW INVESTERING

✓ Werktekening en renders van jouw ontwerp, in te zien in dit portaal

✓ Schouw op locatie vóór de bouw

✓ Bouw door een gecertificeerde vakspecialist uit ons netwerk

✓ Transport, montage en oplevering in Oisterwijk

✓ Garantie op constructie én nazorg na oplevering

Subtotaal excl. btw

€ 31.363,64

Btw 21%

€ 6.586,36

Totaal

€ 37.950,00

BETALEN IN DRIE STAPPEN

40% bij akkoord

€ 15.180,00

Betaald op 4 augustus. Hiermee is de order uitgezet en het hout gereserveerd.

40% bij start bouw

€ 15.180,00

Factuur volgt aan het begin van de bouwweek.

20% bij oplevering

€ 7.590,00

Pas als alles staat en jij tevreden bent.

Volg je project

Opdrachtbevestiging (pdf)

Naar betalingen

Deze offerte is vastgelegd. Wil je toch iets wijzigen? App ons — vóór de bouwweek kan er vaak nog veel.

Screen 2 — My quote (reference; three instalments 40/40/20; provisional sum with *).

VANUIT
AMBACHT

KLANTPORTAAL ·
BUITENVERBLIJVEN

JOUW TRAJECT

Overzicht

Mijn offerte

Ontwerp & renders

Planning & bouw

Foto's & updates

ZAKELIJK

Documenten

Betalingen

CONTACT

Berichten & contact

Oplevering & nazorg

VOOR DE DEVELOPER

Mobiele weergave

Sander de Vries
Uitloggen

Buitenverblijf op maat · project 2026-021

Updates 3WhatsApp ons

Ontwerp & renders

Zo komt jouw buitenverblijf erbij te staan. Bekijk alle aanzichten — en zie 'm ook eens in de avond.

Render-viewer

Versie 2 · 14 augustus

Dag

Avond

RENDER · VOORAANZICHT · VERSIE 2

Vooraanzicht

Zijaanzicht

Interieur
poolhouse

Vanuit de tuin

Impressie op basis van jouw keuzes. Kleur en houttekening kunnen in het echt licht afwijken — hout is natuurlijk materiaal.

Materiaal & afwerking in detail

DOUGLAS

PLAT DAK

VLOER

Douglas, fijnbezaagd
Warm roodbruin, vergrijsd
mooi. Levensduur 10-15 jaar,
langer met onderhoud.

**EPDM-dak & aluminium
daktrim**
Onderhoudsarm en 100%
waterdicht, strakke antraciet
rand.

**Keramische tegels
60x60**
In het poolhouse-deel, kleur
greige — koel in de zomer,
makkelijk schoon.

INDELING · VAN LINKS NAAR RECHTS

poolhouse dicht
3,00 m

lounge overkapt
5,00 m

0 m8,00 m

AFMETING

8,00 × 4,00
meter, hoogte 2,60 m

HOUTSOORT

Douglas
fijnbezaagd, behandeld

DAK

Plat dak
EPDM · aluminium trim

BOUWTIJD

2 weken
week 41 & 42 (voorlopig)

JOUW KEUZES

✓ Poolhouse dicht (3,00 m) met schuifpui op de
zuidzijde

✓ Lounge overkapt (5,00 m) met open zijden

✓ Elektrapakket: 4 spots, stopcontact, schakelaar*

✓ Keramische vloer in het poolhouse-deel

☐ Buitenkeuken in de
lounge —

niet
gekozen

wil je de prijs
weten?

* stelpost — definitief na de schouw

OVER DOUGLAS HOUT

Sterk Europees naaldhout met een warme uitstraling.
Onbehandeld vergrijsd het zilvergrijs; met een jaarlijkse
beurt houdt het zijn roodbruine gloed.

Versies van jouw ontwerp

Zo zie je precies wat er per versie is veranderd

Versie 2

Actueel

14 augustus 2026 · schuifpui verplaatst naar de zuidzijde, overstek 40 cm verbreed — naar aanleiding van jouw opmerking over de middagzon.

Bekijken

Versie 1

6 augustus 2026 · eerste ontwerp op basis van de offerte.

Bekijken

Klopt er iets niet in versie 2, of wil je nog iets anders zien?

Opmerking doorgeven

Screen 3 — Design & renders: render viewer with views and day/evening, detail renders, version history.

VANUIT
AMBACHT

KLANTPORTAAL ·
BUITENVERBLIJVEN

JOUW TRAJECT

Overzicht

2

Mijn offerte

Ontwerp & renders

Planning & bouw

1

Foto's & updates

ZAKELIJK

Documenten

Betalingen

CONTACT

Berichten & contact

Oplevering & nazorg

VOOR DE DEVELOPER

Mobiele weergave

Sander de Vries

Uitloggen

Buitenverblijf op maat · project 2026-021

Updates

3

WhatsApp ons

Planning & bouw

Zo loopt jouw project, week voor week. Verandert er iets, dan hoor je het meteen — ook als dat slecht nieuws is.

DE BOUW VAN JOUW BUITENVERBLIJF

Week 41 & 42 · 5 t/m 16 oktober 2026

Voorlopig — definitief na de schouw

Nog 7 weken. De vakspecialist bouwt in ongeveer twee weken; de oplevering is aan het einde van week 42.

Zodra de planning definitief is, krijg je een agenda-uitnodiging per fase.

Ons voorstel voor de schouw

Wacht op jouw akkoord

Onze vakspecialist controleert de maten, de ondergrond en de toegang tot je tuin. Duurt ongeveer 45 minuten; daarna zetten we de hele planning definitief vast.

Donderdag 27 augustus 2026

rond 10:00 · graag iemand thuis en de achtertuin bereikbaar

Akkoord — plan de schouw in

Wijzigen kan daarna kosteloos tot 2 dagen vooraf.

Past deze dag niet? Laat weten wanneer het wél uitkomt.

Bijvoorbeeld: vrijdag lukt beter, of na 16:00

Andere dag aanvragen

Week voor week

33–34
AUG

Ontwerp & werktekening

Afgerond

Render versie 2 en de werktekening staan in je portaal.

35
24–28 AUG

Schouw op locatie

Voorstel wacht op akkoord

Maten, ondergrond en toegang controleren. Hierna wordt de planning definitief.

39
21–25 SEP

Voorbereiding

Voorlopig

Grondwerk en betonpoeren. Eén dag werk; je tuin blijft verder gewoon bruikbaar.

40
28 SEP–2
OKT

Materialen geleverd

Voorlopig

Het Douglas pakket en het dakmateriaal worden bij je afgeleverd — we hebben ± 15 m² opslagruimte nodig.

41–42
5–16 OKT

De bouw

Voorlopig

Constructie, dak, schuifpui, elektra en vloer. Oplevering aan het einde van week 42, samen met jou.

+3 mnd
JAN

3-maanden-check

Volgt

We nemen contact op om te horen of alles nog naar wens is — hoort bij de nazorg.

Zo bereid je de bouwweek voor

Vink af wat geregeld is — dan weten wij dat ook. Alles staat ook in de voorbereidingsgids bij je documenten.

☒ Toegang naar de achtertuin minimaal 1,20 m breed

☐ Bouwplek leeg en bereikbaar (± 15 m² extra voor materiaal)

☐ Stroompunt beschikbaar op maximaal 25 m

☐ Parkeerplek voor de bus en aanhanger in de buurt

☐ Buren geïnformeerd over de bouwweek

ATTENT VOOR DE BUREN

Burenbrief, kant-en-klaar

Twee weken bouwen geeft wat geluid. We hebben een vriendelijk briefje voor je klaargezet dat je bij de buren in de bus kunt doen — met de bouwdata er al in.

Burenbrief downloaden (pdf)

Zo verloopt de bouw


1 De vakspecialist werkt op werkdagen tussen 7:30 en 16:30.

2 Je hoeft niet thuis te blijven — alleen bij start en oplevering.


3 Elke bouwdag eindigt met een opgeruimde tuin.

4 Vragen tijdens de bouw? Altijd via Tim & Bram, ook 's avonds.

Screen 4 — Schedule & build: survey proposal, week-by-week with provisional/definitive, preparation checklist, neighbour letter.

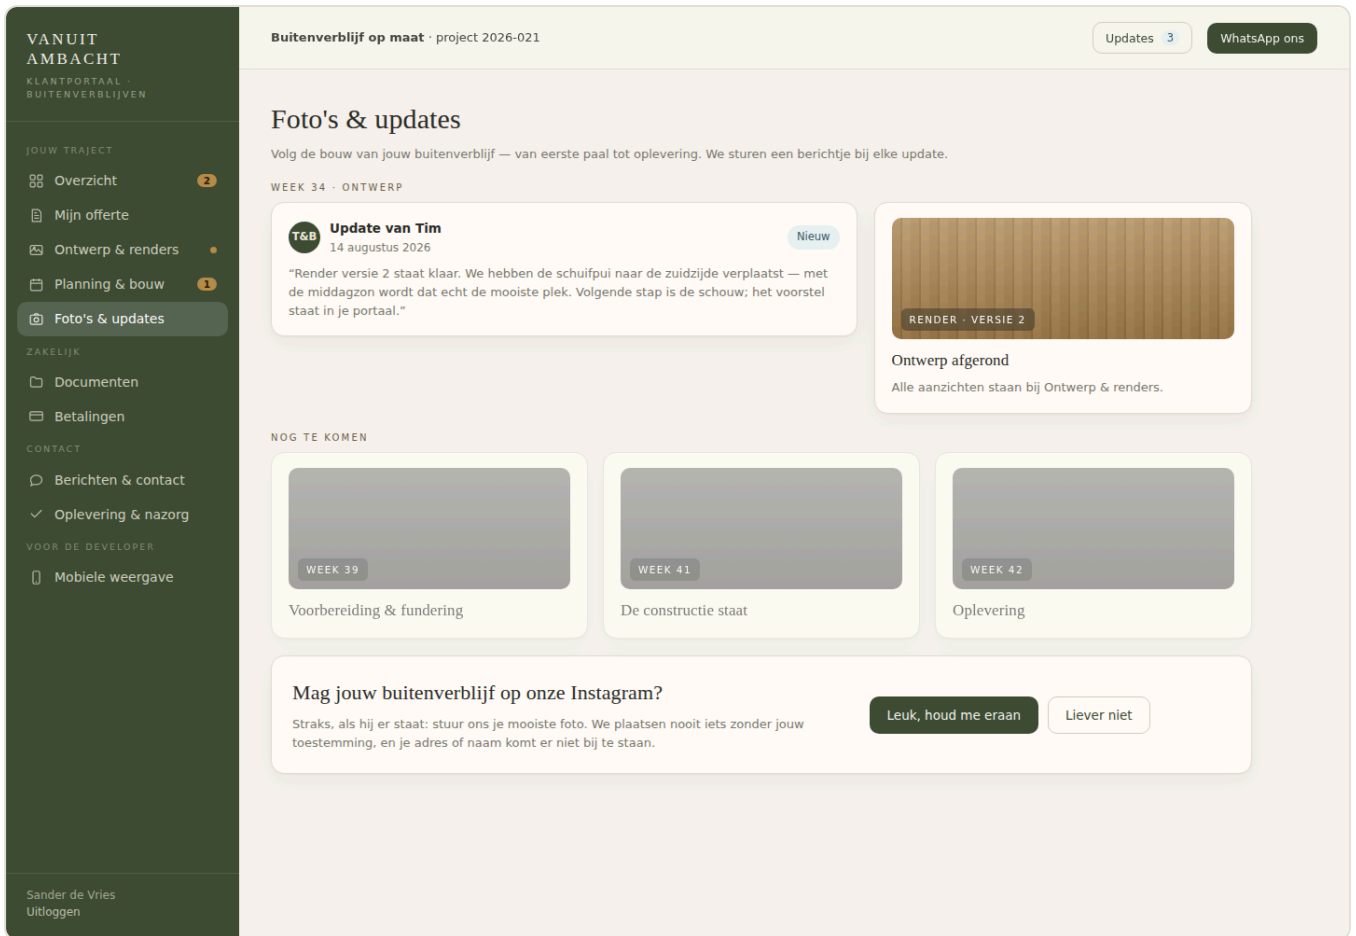

Screen 5 — Photos & updates: mix of photos and personal team updates.

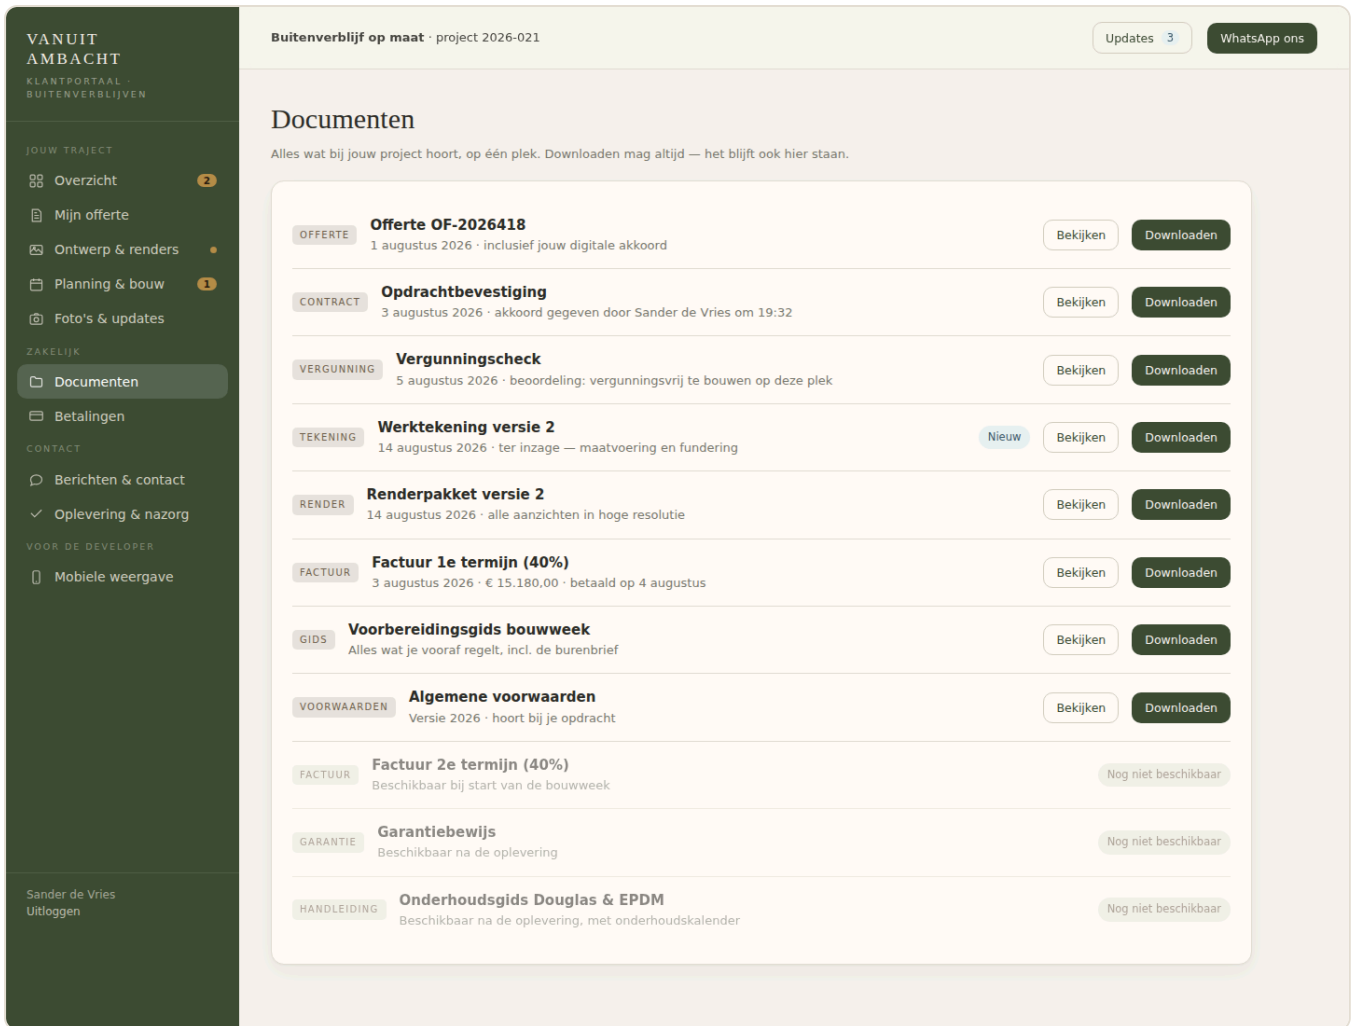

Screen 6 — Documents, incl. permit check, preparation guide and render package.

VANUIT
AMBACHT

KLANTPORTAAL ·
BUITENVERBLIJVEN

JOUW TRAJECT

Overzicht

Mijn offerte

Ontwerp & renders

Planning & bouw

Foto's & updates

ZAKELIJK

Documenten

Betalingen

CONTACT

Berichten & contact

Oplevering & nazorg

VOOR DE DEVELOPER

Mobiele weergave

Sander de Vries

Uitloggen

Buitenverblijf op maat · project 2026-021

Updates 3

WhatsApp ons

Betalingen

Drie termijnen, geen verrassingen. De laatste termijn betaal je pas als alles staat en jij tevreden bent.

TOTAAL

€ 37.950,00

incl. btw

BETAALD

€ 15.180,00

op 4 augustus 2026

NOG TE BETALEN

€ 22.770,00

in twee termijnen

1e termijn · 40%

Betaald

€ 15.180,00

Bij akkoord. Ontvangen op 4 augustus — hiermee is het hout gereserveerd.

Factuur bekijken

2e termijn · 40%

Bij start bouw

€ 15.180,00

Factuur volgt aan het begin van de bouwweek (voorlopig week 41). Betalen kan met iDEAL of overboeking.

Nu betalen (iDEAL)

3e termijn · 20%

Bij oplevering

€ 7.590,00

Pas na de oplevering, als jij tevreden bent en de checklist samen is doorgelopen.

Nu betalen (iDEAL)

Liever zelf overmaken?

Dat kan. Gebruik het factuurnummer als kenmerk, dan kunnen wij het goed verwerken.


IBAN NL27 ABNA 0132 2698 56
t.n.v. Vanuit Ambacht · Vleuten

Vraag over een factuur of termijn?

App of bel ons — we zoeken het meteen op. Bij een project van deze omvang nemen we er altijd rustig de tijd voor.

WhatsApp ons

Screen 7 — Payments: three instalments (40/40/20).



Screen 8 — Messages & contact (identical to the base).

VANUIT
AMBACHT

KLANTPORTAAL ·
BUITENVERBLIJVEN

JOUW TRAJECT

Overzicht

Mijn offerte

Ontwerp & renders

Planning & bouw

Foto's & updates

ZAKELIJK

Documenten

Betalingen

CONTACT

Berichten & contact

Oplevering & nazorg

VOOR DE DEVELOPER

Mobiele weergave

Sander de Vries
Uitloggen

Buitenverblijf op maat · project 2026-021

Updates 3WhatsApp ons

Oplevering & nazorg

Opgeleverd op 16 oktober 2026. Veel plezier van je buitenverblijf — en we blijven bereikbaar.

JOUW BUITENVERBLIJF · 16 OKTOBER 2026

Klopt alles?

We hebben samen de oplevering doorgenomen. Bevestig hieronder — daarna volgt de laatste termijn (20%). Merk je later iets? Nazorg blijft altijd mogelijk.

Gebouwd volgens tekening en render

Dak, goten en afwatering gecontroleerd

Schuifpui, elektra en verlichting werken

Tuin en bouwplek netjes achtergelaten

Alles klopt — bevestigen

Er is iets niet goed

GARANTIE & NAZORG

Garantie op constructie en dak, plus nazorg na oplevering. En over drie maanden nemen we sowieso contact op voor de 3-maanden-check.

Garantiebewijs downloaden

Nazorg aanvragen

Onderhoudskalender

Weinig werk, veel resultaat. We sturen je bij elk seizoen een korte herinnering — als je dat wilt.

LENTE

Hout behandelen

Reinig het Douglas en breng één laag beits of olie aan. Halve dag werk.

ZOMER

Niets — genieten

Hooguit de schuifpui-rails even uitvegen.

HERFST

Dak & afvoer vrij

Blad van het EPDM-dak en uit de afvoer halen. Kwartiertje.

WINTER

Niets nodig

Douglas en EPDM kunnen prima tegen vorst.

Stuur mij per seizoen een onderhoudsherinnering

De 3-maanden-check

In januari nemen we contact op: zit alles nog strak, doet de elektra het, ben je tevreden? Kleine punten lossen we dan meteen op.

Gepland · januari 2027

Zou je ons willen helpen?

Mond-tot-mondreclame is voor ons alles. Een korte review helpt de volgende klant enorm — en ons nog meer.

Review achterlaten op Google


Foto delen op Instagram

Je buitenleven afmaken?

Veel klanten combineren hun buitenverblijf met een buitenkeuken in het overkapte deel. Vaste klant? Dan kijken we scherp mee op de prijs.

Vraag een prijsindicatie

Screen 9 — Handover & aftercare: handover check, seasonal maintenance calendar, 3-month check.

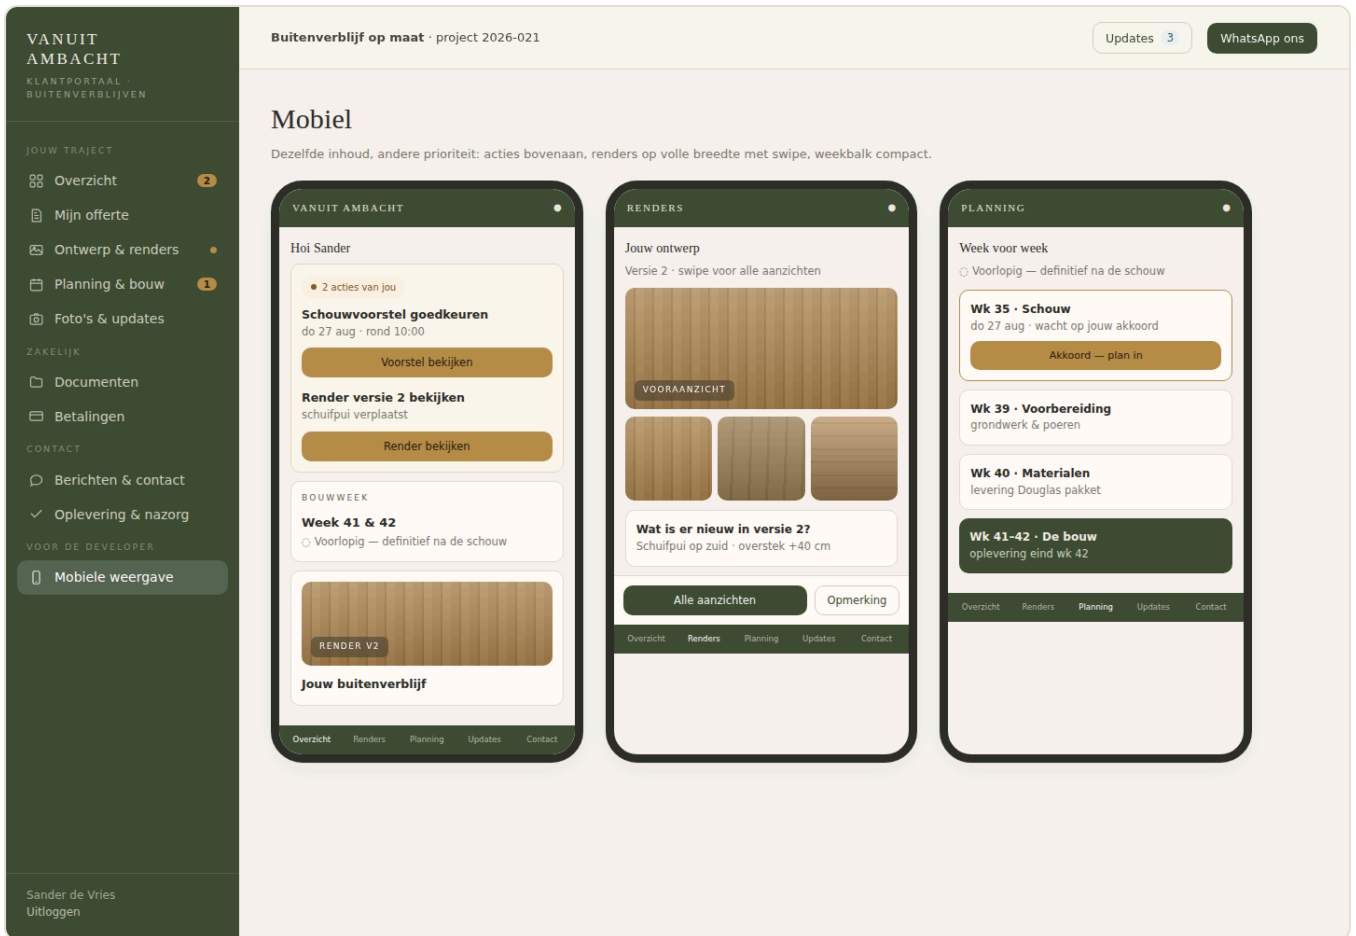

Mobile designs: overview, render viewer and week schedule in phone view.

Mobile (emulated at 390 px wide)



Responsive behaviour at 390 px — Overview.



Responsive behaviour at 390 px — Schedule & build.
